

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 0106/2020
číslo smlouvy Zhotovitele: S21-015-0009

Název akce: **Oprava místní komunikace 17c Květuš-Růžená**
Číslo projektu: **459-01-004/20**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

	Obec Chyšky
Sídlo:	Chyšky 27, 398 53 Chyšky
Zastoupený:	Stanislava Hejnová, starostka obce
Korespondenční adresa:	Chyšky 27, 398 53 Chyšky
IČO:	00249718
DIČ:	CZ00249718
Číslo účtu:	Komerční banka a.s., 3029271/0100
Telefon:	382 591 206; 724 180 173

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních vč. podpisu: Stanislava Hejnová, starostka obce
tel.: 382 591 206; 724 180 173 e-mail: obec@chysky.cz

Ve věcech tech. plnění a převzetí díla:

tel.: e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo:	Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
Korespondenční adresa:	P. O. BOX 38, 390 02 Tábor (platí zároveň jako fakturační adresa)
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	Česká spořitelna a.s., 994404-0147137001/0800
Telefon / Fax:	381 256 025 / 381 258 672
ID datové schránky:	amx5p38

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
tel.: 602 490 672 e-mail: j.sochurek@swietelsky.cz

Ve věcech technických: Michael Wiedermann, stavbyvedoucí
tel.: 724 742 679 e-mail: m.wiedermann@swietelsky.cz

Kontaktní osoba: Jaroslav Sochůrek, ředitel oblasti Tábor
tel.: 602 490 672 e-mail: j.sochurek@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla: Oprava místní komunikace 17c Květuš-Růžená
2.2. Stavební práce – vlastní realizace – oprava místní komunikace 17c Květuš-Růžená
2.3. Místo plnění: Obec Chyšky

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

- a. předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání díla
- b. předložení protokolů o zkouškách,
- c. předložení návodu na používání komunikace.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: po podpisu smlouvy

Zahájení prací: 1. 7. 2020 (po podpisu smlouvy)

Ukončení prací: 30. 9. 2020 (nejpozději)

- 3.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním projektové dokumentace nebo předáním stavebního ohlášení nebo staveniště zhotoviteli stavby,
- 3.2. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
- 3.3. Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy:
- a. bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích hodin v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení na měření rychlosti větru, a/nebo
 - b. průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude

nižší než -5 stupňů Celsia.

O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis zhotovitele do stavebního deníku.

Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění.

- 3.4. Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.
- 3.5. Jsou-li práce z důvodů působení vyšší moci nebo z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 1 týden, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací vzniklých vícenákladů a při přerušení prací v součtu delším než 2 měsíce také přiměřenou úpravu smluvní ceny.
- 3.6. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu v součtu všech přerušení delší než 2 měsíce, je zhotovitel také oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Smluvní cena

- 4.1. Cena je zpracována po položkách ve výkazu výměr, který je taktéž nedílnou součástí nabídky zhotovitele č. N21-015-0038 ze dne 9. 6. 2020.
- 4.2. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo, dle předložené nabídky činí:

bez DPH	1 388 691,15 Kč
DPH 21 %:	291 625,14 Kč
Cena včetně DPH:	1 680 316,29 Kč

- cena za předmět plnění – bez DPH, DPH a s DPH, cena byla sjednána jako konečná a nejvýše přípustná v rámci vyhlášené zakázky, dodavatel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH
- změna ceny díla je možná jen písemnou formou prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků SoD
- v případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
- případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max.do 80% aktuální cenové úrovně

- 4.3. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a

k vystavení soupisu provedených prací.

4.4. Cena se sjednává s daní z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.

5. Fakturace, platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná v rámci vyhlášené zakázky, zhotovitel nesmí překročit její výši.

Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH.

Objednatel uhradí zhotoviteli vysoutěženou cenu jednorázově bankovním převodem po obdržení faktury po předchozím předání předmětu plnění celé zakázky bez vad a nedodělků a po předání veškerých nutných souvisejících dokladů, včetně stavebního deníku. O tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena dodavatelem nejpozději do 14 kalendářních dnů po odsouhlasení a předání/převzetí předmětu celé zakázky bez vad a nedodělků a po podpisu příslušného předávacího protokolu.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a její doba splatnosti bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, která počne běžet dnem následujícím po jejím doručení zadavateli. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Faktura bude členěna dle struktury specifikované v zadávací dokumentaci a krycím listu nabídky. Na faktuře bude uveden celý název projektu: Oprava místní komunikace 17c Květuš-Ružená a Registrační číslo projektu: 459-01-004/20. Nedílnou součástí faktury – přílohou bude soupis provedených prací odsouhlasený zadavatelem. Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.

Nebude-li mít faktura tyto náležitosti, její splatnost nenastane. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne zhotoviteli vady faktury; zhotovitel na základě oprávněné výzvy objednatele vystaví novou fakturu splňující všechny požadované náležitosti; splatnost faktury počne běžet dnem následujícím po jejím opětovném doručení objednateli.

- fakturu lze vystavit po předchozím podpisu příslušného předávacího protokolu a po předání veškerých nutných dokladů, které se k dílu vztahují, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti a přílohy k faktuře.

6. Způsob provedení díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je

povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 6 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor jsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínu dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště bezplatně.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel nepřevzme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

10. Reklamac

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamac sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 14 dnů od obdržení písemného oznámení reklamac.

U reklamac, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamac nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když nebude reklamac ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel může provést opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce **60 měsíců**.
- 11.2. Zhotovitel nepřebírá záruku za poruchy konstrukčních vrstev komunikací v souvislosti s nevhodným využíváním komunikace.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za pozdní provedení/odevzdání předmětu plnění bez vad a nedodělků 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení, po nejpozdějším datu ukončení díla.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; .
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 10 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu provedených prací k datu odstoupení, a to do 10 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran, např.:
 - a. v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby,
 - b. v případě nutnosti realizovat práce a dodávky vyplývající z rozhodnutí veřejnoprávních a jiných orgánů.
- 14.3. Případné změny, budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v cenové nabídce. Nebude-li možno určit cenu z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena podle cen individuální kalkulace zhotovitele (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platného v době provádění díla – max.do 80% aktuální cenové úrovně.
- 14.4.
 - zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním

přepisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
Originál při ukončení odevzdá objednateli.

- zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě.

- zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá objednateli.

- Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2030.

- zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.

- zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s technickou projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo smlouvě, uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

- zhotovitel poskytne při plnění smlouvy potřebnou součinnost; smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží 2 vyhotovení; veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran; smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami
- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy
- 15.4. Zhotovitel bere na vědomí, že celá smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele – objednatele.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisů stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením

této smlouvy, nese zhotovitel.

- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Příloha: 1. Soupis prací
2. Plná moc pro zastupování zhotovitele


Smlouvu přezkoumal: Ing. Pavel Kodat

V Chyškách dne 29.06.2020

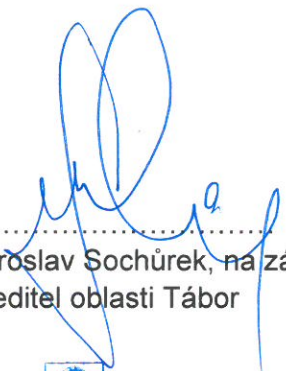
V Táboře dne 29.06. 2020

Obec Chyšky
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel


Stanislava Hejnová
starostka obce

OBEC CHÝSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718


Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
ředitel oblasti Tábor



SWIETELSKY (23)

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KVĚTUS_01
Stavba: Oprava MK 17c Květuš - Růžená

KSO:
Místo: Obec Chyšky

CC-CZ:
Datum: 09.06.2020

Zadavatel:
Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ: 00249718
DIČ: CZ00249718

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 388 691,15
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 388 691,15	291 625,14
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 680 316,29
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KJETUS 01

Stavba: Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Místo: Obec Chyšky

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 388 691,15	1 680 316,29
KJETUS_01	Oprava MK Květuš - Růžená	458 802,94	555 151,56
KJETUS_02	Oprava MK Květuš - Růžená	905 307,21	1 095 421,72
Doplňující údaje	Oprava MK Květuš - Růžená	24 581,00	29 743,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

KVETUS_01 - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

KSO:

Misto: Obec Chyšky

CC-CZ:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

458 802,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 802,94	21,00%	96 348,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

555 151,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

KVETUS_01 - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Místo:

Obec Chyšky

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

0

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

458 802,94

HSV - Práce a dodávky HSV

458 802,94

1 - Zemní práce

7 992,90

5 - Komunikace pozemní

445 647,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 162,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

KVETUS_01 - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Místo: Obec Chyšky

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant: 0

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

458 802,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

458 802,94

D 1

Zemní práce

7 992,90

1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	116,40	42,34	4 928,38	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	--------	-------	----------	------------

PP

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PSC

VV

" délka 344m, 15cm oboustranně"

VV

"délka 81, 50cm"

VV

"délka 81m, 30cm"

VV

"odvoz do vzdálenosti 6km určí Obec Chyšky"

VV

344*0,15+81*0,5+81*0,3

116,40

VV

Součet

116,40

9	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	51,60	33,52	1 729,63	OTSKP 2019
---	---	-------	--	----	-------	-------	----------	------------

PP

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

VV

"délka 344m"

VV

"šířka 0,15m"

VV

344*0,15

51,60

VV

Součet

51,60

10	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	51,60	25,87	1 334,89	OTSKP 2019
----	---	-------	----------------------------------	----	-------	-------	----------	------------

PP

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

Poznámka k souboru cen:

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

VV

"délka 344m"

VV

"šířka 0,15m"

VV

344*0,15

51,60

VV

Součet

51,60

D 5

Komunikace pozemní

445 647,31

8	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	64,80	71,84	4 655,23	OTSKP 2019
---	---	-------	---	----	-------	-------	----------	------------

PP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"dosypání krajnic mimo sportoviště"

VV

"délka 81, 50cm"

VV

"délka 81m, 30cm"

VV

81*0,5+81*0,3

64,80

VV

Součet

64,80

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 351,50	8,72	11 785,08	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	----------	------	-----------	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV

"spojovací pstrík PS C 0,3kg/m2 ČSN 73 6129"

VV

"délka 425m"

VV

"šířka 3,1m"

VV

"připojení 5*2+5*2+7*2"

VV

425*3,1+5*2+5*2+7*2

1 351,50

VV

Součet

1 351,50

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 351,50	8,72	11 785,08	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	----------	------	-----------	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "spojovací pstrík PS C 0,3kg/m2 ČSN 73 6129" "délka 425m" "šířka 3,1m" "připojení 5*2+5*2+7*2" 425*3,1+5*2+5*2+7*2 Součet					
	PSC				1 351,50			
	VV				1 351,50			
4	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	54,06	3 683,17	199 112,17	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "Vyrovnání ACO 11 ČSN 73 6121" "tloušťka vyrovnání 40mm" "délka 425m" "šířka 3,1m" "připojení 5*2+5*2+7*2" "měrná hmotnost 2,4t/m3, tj 54,06 x 2,4=129,75t" (425*3,1+5*2+5*2+7*2)*0,04 Součet					
	PSC				54,06			
	VV				54,06			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 317,50	165,70	218 309,75	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+, ČSN 73 6121" "délka 425m" "šířka 3,1m" 425*3,1 Součet					
	PSC				1 317,50			
	VV				1 317,50			
	VV							
	VV							
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 162,73	
2	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 351,50	3,82	5 162,73	OTSKP 2019
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu "délka 425m" "šířka 3,1m" "připojení 5*2+7*2+5*2" 425*3,1+(5*2+7*2+5*2) Součet					
	PSC				1 351,50			
	VV				1 351,50			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

KVETUS_02 - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

KSO:

Místo: Obec Chyšky

CC-CZ:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

905 307,21

DPH základní
snížená

Základ daně
905 307,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
190 114,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 095 421,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

KVETUS_02 - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Místo:

Obec Chyšky

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

0

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

905 307,21

HSV - Práce a dodávky HSV

905 307,21

1 - Zemní práce

31 331,60

5 - Komunikace pozemní

865 495,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 480,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

KVETUS_02 - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Místo: Obec Chyšky

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant: 0

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

905 307,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

905 307,21

D 1

Zemní práce

31 331,60

1	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	740,00	42,34	31 331,60	OTSKP 2019
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"celková délka 740 oboustranně"					
	VV		"šířka 50cm"					
	VV		"odvoz do vzdálenosti 6km určí Obec Chyšky"					
	VV		740*0,5*2		740,00			
	VV		Součet		740,00			

D 5

Komunikace pozemní

865 495,21

8	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	726,00	71,84	52 155,84	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"celková délka 726 oboustranně"					
	VV		"šířka 50cm"					
	VV		726*0,5*2		726,00			
	VV		Součet		726,00			

9	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	770,00	94,41	72 695,70	OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		"celková délka 740 oboustranně"					
	VV		"šířka 50cm"					
	VV		"připojení lesních cest 30m2"					
	VV		740*0,5*2+30		770,00			
	VV		Součet		770,00			

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 245,00	8,72	19 576,40	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"spojovací pstrík PS C 0,3kg/m2 ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		"připojení 25m2"					
	VV		740*3,0+25		2 245,00			
	VV		Součet		2 245,00			

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 220,00	8,72	19 358,40	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"spojovací pstrík PS C 0,3kg/m2 ČSN 73 6129"					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		740*3,0		2 220,00			
	VV		Součet		2 220,00			
4	K	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	89,80	3 677,63	330 251,17	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"Vyrovnání ACO 11 ČSN 73 6121"					
	VV		"tloušťka vyrovnání 40mm"					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		"připojení 25m2 u mostu konec SO 102"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3 tj. 89,8 x 2,4=215,52t"					
	VV		(740*3,0+25)*0,04		89,80			
	VV		Součet		89,80			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 245,00	165,46	371 457,70	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		"připojení 25m2"					
	VV		740*3,0+25		2 245,00			
	VV		Součet		2 245,00			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 480,40	
2	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 220,00	3,82	8 480,40	OTSKP 2019
	PP		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		"délka 740m"					
	VV		"šířka 3,0m"					
	VV		740*3,0		2 220,00			
	VV		Součet		2 220,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

KSO:

Místo: Obec Chyšky

CC-CZ:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

IČ:

00249718

DIČ:

CZ00249718

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 581,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 581,00	21,00%	5 162,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 743,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Místo:

Obec Chyšky

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

09.06.2020

Projektant:

0

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 581,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK 17c Květuš - Růžená

Místo:

Obec Chyšky

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky

Projektant:

0

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 581,00

1	K	02710	DIO - ZAJIŠTĚNÍ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "DIO"	KPL	1,00	24 581,00	24 581,00	OTSKP-SPK 2019
	PP							
	VV							
	VV		1		1,00			



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, nar. 17. 12. 1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice.

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Českých Budějovicích dne 13. 5. 2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu
